

Vite & Gourmand

Documentation de Gestion de Projet

Méthode Kanban — Outil Trello

Version 1.0 — 2024

Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile

1. Contexte du projet

Le projet Vite & Gourmand s'inscrit dans le cadre de l'obtention du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile. Il consiste en la réalisation d'une application web complète pour une entreprise de traiteur bordelaise.

L'application a été développée en solo sur une durée estimée à une centaine d'heures, en combinant les phases d'analyse, de conception, de développement et de déploiement.

Caractéristiques du projet

Critère	Détail
Type de projet	Application web full-stack (front-end + back-end)
Contexte	ECF — Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile
Équipe	Développeur solo
Durée estimée	~100 heures de travail
Stack technique	PHP / Symfony 7 / MariaDB / MongoDB / Bootstrap 5
Déploiement	Fly.io (production)
Gestion de projet	Méthode Kanban — Outil Trello
Versioning	Git / GitHub (branches feature, développement, main)

2. Méthodologie choisie : Kanban


Pour ce projet solo, j'ai opté pour la méthode Kanban, une approche agile adaptée au travail individuel. Contrairement à Scrum qui nécessite une équipe et des sprints définis, Kanban offre une plus grande flexibilité tout en maintenant une visibilité claire sur l'avancement du projet.

Pourquoi Kanban ?

- **Flexibilité** : Permet d'ajouter ou de réorganiser les tâches au fil des besoins, ce qui est adapté à un projet solo où les priorités peuvent évoluer.
- **Visualisation** : Le tableau offre une vue d'ensemble immédiate de l'état du projet sans réunion ni cérémonie formelle.
- **Flux continu** : Pas de sprints imposés : chaque fonctionnalité est développée, testée et déployée indépendamment.
- **Simplicité** : Outil léger à mettre en place, idéal pour un développeur seul qui doit se concentrer sur le code.

Structure du tableau Kanban

Le tableau Trello est organisé en quatre colonnes représentant le cycle de vie de chaque tâche :

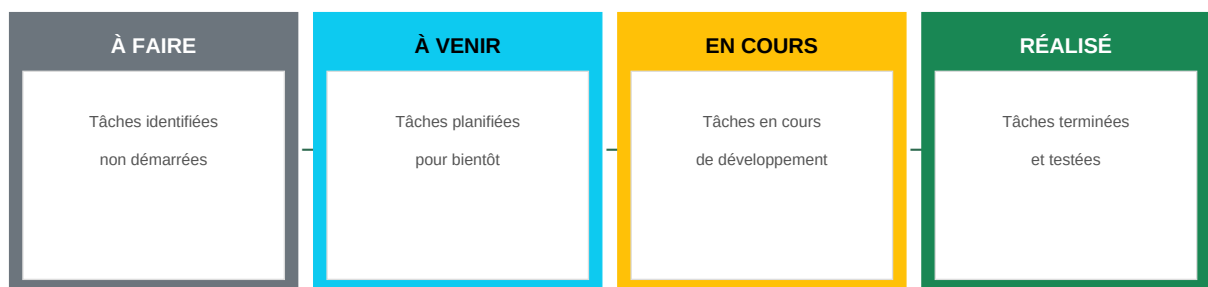

Flux de travail : chaque tâche passe de gauche à droite au fil de son avancement. Une tâche ne revient jamais en arrière une fois déplacée.

3. Outil de gestion : Trello

Trello est un outil de gestion de projet en ligne basé sur le principe des tableaux Kanban. Il permet de créer des cartes représentant des tâches et de les déplacer entre les colonnes selon leur état d'avancement.

Utilisation de Trello sur ce projet

Chaque fonctionnalité identifiée dans le cahier des charges a été créée sous forme de carte Trello. Les cartes ont été organisées par domaine fonctionnel :

■ Front-end public

- Page d'accueil
- Vue globale des menus + filtres
- Vue détaillée d'un menu
- Page contact
- Pied de page (horaires, mentions légales, CGV)

■ Authentification

- Inscription utilisateur
- Connexion / déconnexion
- Mot de passe oublié / réinitialisation

■ Commandes

- Formulaire de commande
- Calcul frais livraison et réduction
- Mail de confirmation
- Annulation commande

■ Espace utilisateur

- Profil et modification infos
- Suivi des commandes
- Dépôt d'avis

■ Espace employé/admin

- Dashboard et KPI
- Gestion statuts commandes + historique
- Validation des avis
- Gestion menus et plats
- Gestion horaires
- Gestion employés (admin)

■ Technique


- Modélisation BDD (MariaDB + MongoDB)

- Fixtures de test
- Statistiques MongoDB + graphiques
- RGAA accessibilité
- Déploiement Fly.io

4. Gestion du versioning : Git / GitHub

En complément du tableau Kanban, la gestion du code source a été réalisée avec Git et GitHub. Le versioning est étroitement lié à la gestion de projet : chaque carte Trello passée en "EN COURS" correspond à la création d'une branche Git dédiée.

Stratégie de branches

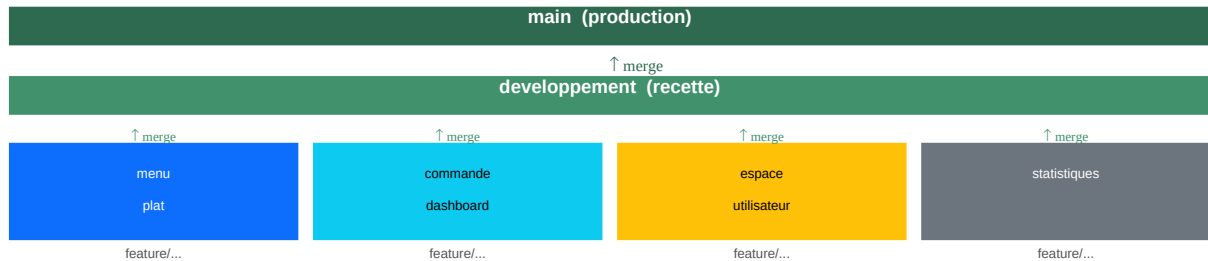

Règles de versioning appliquées :

- Chaque nouvelle fonctionnalité = une branche **feature/*** créée depuis **developpement**
- Les tests sont effectués sur la branche feature avant tout merge
- Merge de **feature** → **developpement** après validation
- Merge de **developpement** → **main** uniquement pour les livraisons stables
- Messages de commit explicites : *feat:*, *fix:*, *refactor:*
- Suppression des branches feature après merge pour garder un dépôt propre

Exemples de branches créées :

Branche	Fonctionnalités développées
feature/menu-plat-management	CRUD menus et plats, gestion allergènes
feature/commande-dashboard-vues-publiques	Commande, dashboard employé, vues publiques
feature/espace-utilisateur	Profil, suivi commandes, dépôt avis
feature/statistiques-graphiques	MongoDB, statistiques, graphiques Chart.js
feature/footer-accessibilite	Footer horaires, mentions légales, CGV, RGAA

5. Déroulement du projet

Le projet s'est déroulé en plusieurs phases successives, chacune correspondant à un ensemble de cartes Trello déplacées de "À FAIRE" vers "RÉALISÉ".

Phase 1 — Analyse et conception (~10h)

- Lecture et analyse du cahier des charges
- Modélisation de la base de données (MCD, diagrammes)
- Création du tableau Trello et identification de toutes les tâches
- Choix techniques : Symfony 7, MariaDB, MongoDB, Bootstrap 5
- Mise en place de l'environnement de développement
- Initialisation du projet Symfony et du dépôt GitHub

Phase 2 — Fondations techniques (~15h)

- Création des entités Doctrine (Utilisateur, Menu, Plat, Commande...)
- Mise en place de la sécurité Symfony (authentification, rôles)
- Inscription, connexion, mot de passe oublié
- Structure de la base de données MariaDB
- Configuration du Mailer Symfony (Mailtrap)
- Template de base (base.html.twig, navbar dynamique)

Phase 3 — Front-end public (~15h)

- Page d'accueil (présentation, menus vedettes, avis)
- Vue globale des menus avec filtres dynamiques
- Vue détaillée d'un menu (plats, allergènes, conditions)
- Page contact avec envoi de mail
- Pied de page dynamique (horaires depuis BDD)
- Pages mentions légales et CGV

Phase 4 — Commandes (~15h)

- Formulaire de commande en 3 étapes
- Calcul automatique frais de livraison (5€ + 0,59€/km)
- Réduction 10% automatique (nb personnes $\geq$ min + 5)
- Récapitulatif prix dynamique via AJAX
- Mail de confirmation automatique
- Gestion du stock (décrémentations)

Phase 5 — Espaces employé et admin (~20h)

- Dashboard avec KPI en temps réel
- Gestion des commandes (statuts, historique, annulation)
- Validation/refus des avis clients

- CRUD menus, plats, allergènes
- Gestion des horaires
- Gestion des employés (admin)
- Statistiques MongoDB + graphiques Chart.js

Phase 6 — Espace utilisateur (~10h)

- Profil utilisateur (modification infos, mot de passe)
- Liste et suivi des commandes
- Modification et annulation de commande
- Dépôt d'avis (note + commentaire)

Phase 7 — Qualité et déploiement (~15h)

- Validation JavaScript sur tous les formulaires (protection XSS)
- Accessibilité RGAA (aria-labels, focus visible, skip link)
- Fixtures de données de test
- Rédaction du README.md
- Configuration et déploiement sur Fly.io
- Tests complets des parcours utilisateur

6. Bilan de la gestion de projet

Points positifs

- La méthode Kanban a permis une vision claire et continue de l'avancement, sans overhead organisationnel excessif pour un projet solo.
- Le découpage en branches Git feature a facilité la gestion des fonctionnalités indépendantes et permis de revenir en arrière en cas de problème.
- L'utilisation des fixtures Doctrine a accéléré les phases de test en disposant toujours de données réalistes.
- La séparation claire des rôles (visiteur, utilisateur, employé, admin) dès la conception a évité de nombreuses refactorisations.

Points d'amélioration

- L'estimation du temps par tâche aurait permis un meilleur suivi de la vélocité et d'anticiper les dépassements éventuels.
- Un découpage plus granulaire des cartes Trello (sous-tâches) aurait amélioré la précision du suivi.
- La mise en place de tests automatisés (PHPUnit) aurait renforcé la qualité du code et réduit le temps de tests manuels.

Répartition estimée du temps

Phase	Durée estimée	% du projet
Analyse et conception	~10h	10%
Fondations techniques	~15h	15%
Front-end public	~15h	15%
Commandes	~15h	15%
Espaces employé et admin	~20h	20%
Espace utilisateur	~10h	10%
Qualité et déploiement	~15h	15%
TOTAL	~100h	100%
